



弘前城天守曳戻し 作業予定表


※天候等により変更、休工となる場合があります。



令和7年度 重要文化財弘前城天守曳戻し工事

工事期間：令和7年10月3日～令和9年3月30日

今週	期 間	6 月 8 日～ 6 月 12 日	次週	期 間	6 月 15 日～ 6 月 19 日
	工 種	揚家準備工事、揚家工事		工 種	揚家工事、曳戻し準備工事
	内 容	天守揚家に伴う仮補強材設置及び油圧ジャッキ設置（天守土台、柱、梁の変形防止用）		内 容	天守揚家及び1次移動用曳家レール設置
	ハイライト	6月12日10時～天守揚家開始 （仮天守台からの切り離し）		ハイライト	－

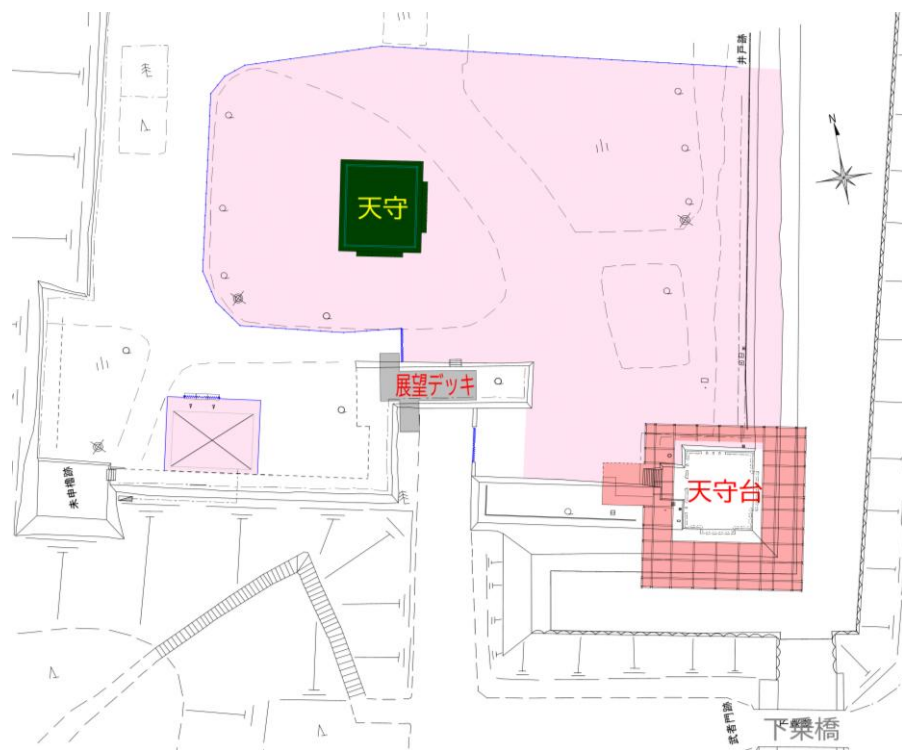

令和8年6月10日時点の天守位置
【仮天守台上】



令和8年6月10日時点の状況写真
【揚家用ジャッキ設置】
