



弘前城天守曳戻し 作業予定表


※天候等により変更、休工となる場合があります。



令和7年度 重要文化財弘前城天守曳戻し工事

工事期間：令和7年10月3日～令和9年3月30日

今 週	期 間	6 月 22 日～ 6 月 26 日	次 週	期 間	6 月 29 日～ 7 月 3 日
	工 種	揚家工事、曳戻し準備工事		工 種	曳戻し準備工事、曳戻し工事
	内 容	天守揚家及び1次移動用レール設置		内 容	1次移動用レール設置及び天守1次移動
	ハイライト	6月22日揚家終了（76cm）		ハイライト	7月1日10時から1次移動開始（4日間、東へ19m）

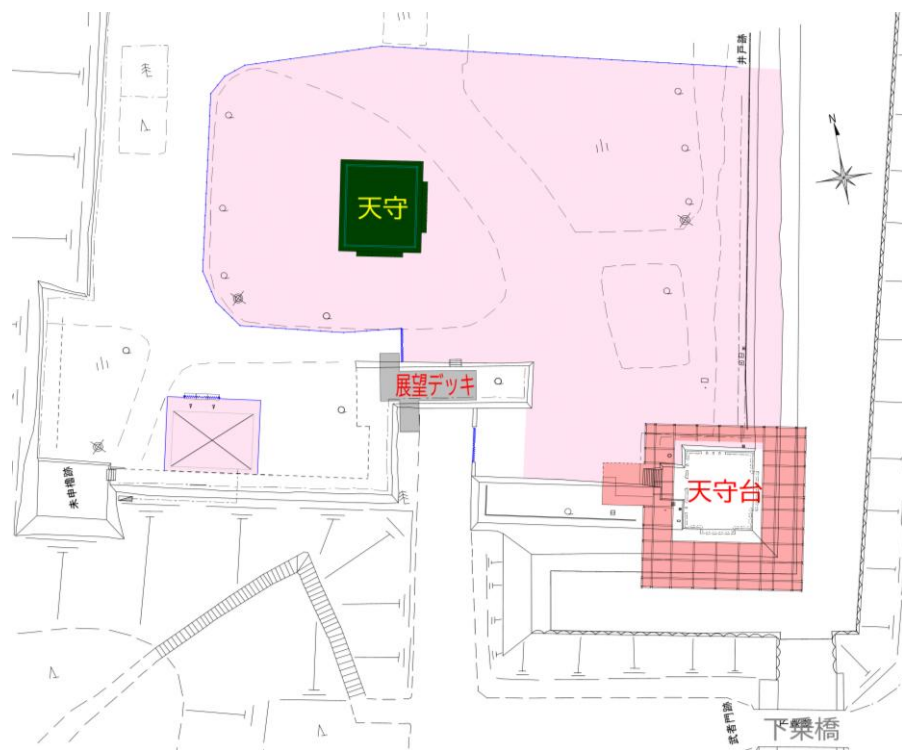

令和8年6月15日時点の天守位置
【仮天守台上】



令和8年6月24日時点の状況写真
【1次移動用レール設置（天守東側）】
